

2025 年 7 月 16 日

関係者 各位

管財部調達課

多摩キャンパス 8 号館 2 階 8205 教室天井等耐震化工事について

平素より学内工事にご理解とご協力を賜りありがとうございます。

標記の件、多摩キャンパス 8 号館 2 階 8205 教室天井等耐震化工事を下記の通り予定しております。

工事期間中はご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力の程何卒よろしくお願いいたします。

記

件 名 多摩キャンパス 8 号館 2 階 8205 教室天井等耐震化工事

工事場所 多摩キャンパス 8 号館 2 階 8205 教室

工事日時 2025 年 8 月 8 日(金)～9 月 19 日(金)

工事会社 株式会社竹中工務店(担当:原氏)

問合せ先 管財部調達課 矢崎・山 (内線 2154)

備 考

- ・8 号館西側駐輪場、8205 室前に資材・産廃ヤードを設置いたします。
- ・西門付近に車両を駐車し、資材を搬出入いたします。
- ・8206 教室を工事期間中の休憩場所として利用いたします。
- ・一部騒音を伴う作業が発生いたします。
- ・詳細は、別紙の工程表及び仮設計画書をご参照ください。
- ・安全には十分に留意いたしますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

以 上

中央大学多摩キャンパス 8号館2階8205教室天井等耐震化工事 総合工程表																																																																																														
期間：2025年 7月 31日 ～ 2025年 9月 22日																																																																																														
(2025年 6月 9日作成)																																																																																														
作業	期間	7月																															8月																															9月																														
		31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																																							
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月																																														
行事		▼着工 ▼定例会議 ▼現場確認会 ▼定例会議 ▼足場解体前検査 ▼定例会議 ▼足場解体前検査 ▼竣工検査 ▼竣工 オープンキャンパス 大学夏季休暇期間(2025/8/1～9/21) 工事期間(2025/8/8～9/19) ： 休工日 ： 土,日,祝日 (稼働日)																																																																																												
準備工事		8206教室休憩所整備																																																																																												
仮設工事		床・壁養生																																																																																												
解体工事		足場組立																																																																																												
内装工事		事務所・休憩所片付																																																																																												
天井耐震化工事		養生撤去 クリーニング																																																																																												
塗装工事		清掃																																																																																												
電気設備工事		足場解体																																																																																												
その他工事		照度測定																																																																																												
備考		検査・量正																																																																																												
搬出入車両		室内環境測定																																																																																												
騒音		騒音小																																																																																												
		騒音中																																																																																												
		騒音小																																																																																												

■ 学内関係者様の安全確保、執務環境に十分配慮した仮設計画としています


2 全体仮設計画

●作業所事務所・休憩所設置計画

- 貴8206教室を使用させていただき、トイレは至近のトイレを借用致します。
- 使用する場所の床面にはシート養生を施し、竣工後はクリーニングを実施します。
- 工事期間中は鍵の借用をさせていただきます。
- 喫煙所は利用人数を調整の上、9号館指定場所にて行うこととします。

●搬出入車両動線計画

- 西門駐輪場からの搬出入車両動線がメイン動線となります。
- 西門側駐輪場とその付近を荷取ヤードとし、資機材の搬出入は台車により運搬いたします。
- 学内関係者との交差部分については安全確保を確実にし、制限速度(1.5km/h)を遵守し通行します。
- 出入庫時には誘導員を配置します。



仮設事務所1棟
休憩所2棟

搬出入ヤード

西門 搬出入時使用
入退場制限有(左折入退場)
※誘導員を配置します



9号館指定喫煙所



作業員動線

施工箇所

正門 搬出入時使用
(右折入退場禁止)

工事関係者駐車場(左折入退場)
※駐車カードを事前に発行依頼

●全体配置図

学内関係者様優先の最適な工事計画

3 8号館仮設計画

●作業員・搬出入動線計画(足場組立、解体時・鉄骨材搬入時)

- ・8205教室につながる動線を関係者以外立ち入り禁止にします。
- ・8205教室出入口前を資材ヤードといたします。
- ・8205教室前出入口を搬出入のメイン動線とします。
- ・作業員他、人のメイン動線は南側外部の出入口を利用いたします。



資材・産廃ヤード
駐輪場半分程度
借用期間（8/8～9/19）



搬出入車両

搬出入動線



搬出入動線

資材・産廃ヤード（2×10m程度）
借用期間（8/8～9/19）

※各ヤードの床はシート及び、部分的にプラベニヤ養生

●8号館配置図



※ヤードの床はポリフィルムシート及び、部分的にプラベニヤ養生

資材ヤード
借用期間（8/8～9/19）

EPS
（電源対応）

学内関係者動線

搬出入動線

借用トイレ（女子）
※看板を明示

8205教室

借用トイレ（男子）
※看板を明示

8206教室

8206教室
作業員休憩所

作業員動線

安全・工程に配慮した最適な工事計画

4 仮設計画（ステージ足場）

●作業エリア ステージ足場計画

- ・作業エリアの天井改修工事時に全面ステージ足場を設置し、安全を最優先とした計画とします。
- ・ステージを支える下部の枠組足場はスパンを飛ばした計画とし、搬出入材料を縮小する事で、第三者への安全と工程に配慮した計画としています。

工事説明会定例会議



着工時工事説明会を開催し、工事中は定例会議を行い、情報を共有します。

学内入場者の管理・教育




新規入場者教育・朝礼にて、学内のご要望・注意事項を作業員に周知徹底し、貴学環境に配慮した作業を実施します。

工事関係者の識別




作業員は腕章を必ず装着します。

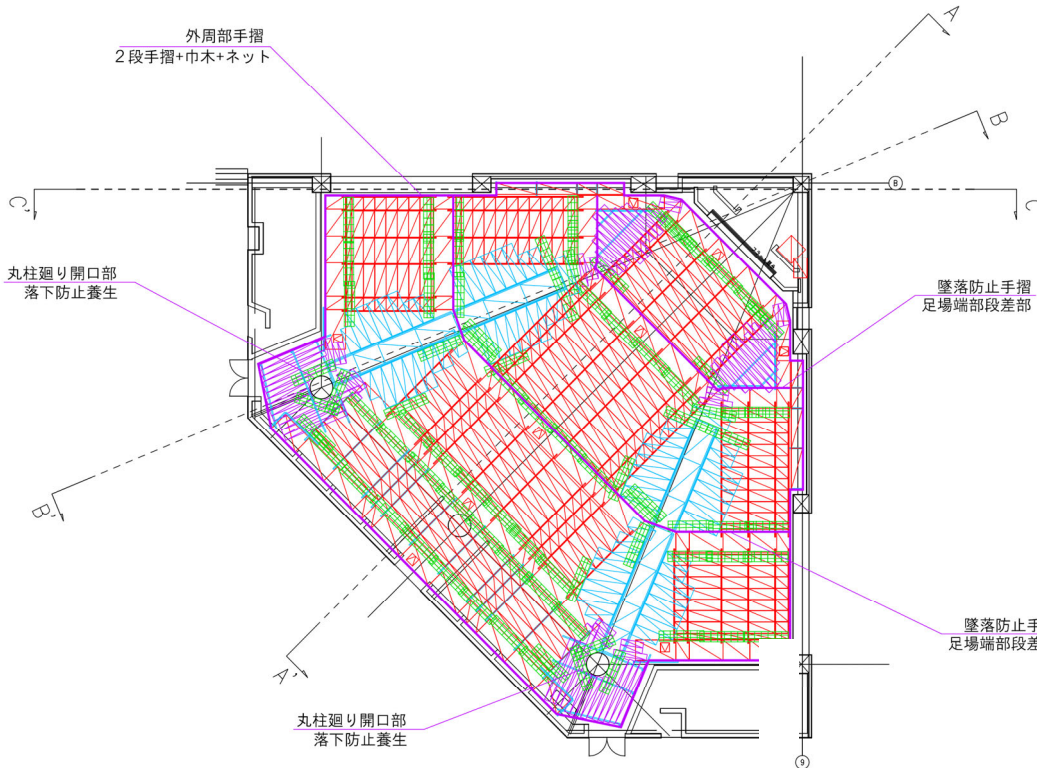

●ステージ足場平面図



仮設足場組立イメージ
※今回は防疫シートを使用しません

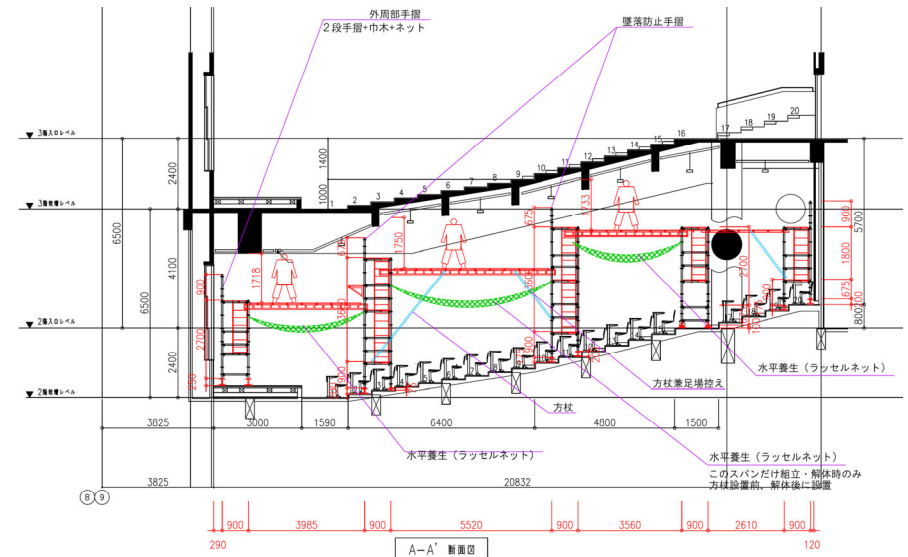

●ステージ足場断面図
