

2023 年 7 月 24 日

関係者 各位

管財部調達課

多摩キャンパス 2 号館 2 階南側男女トイレ改修工事について

平素より学内工事にご理解とご協力を賜りありがとうございます。

標記の件、多摩キャンパス 2 号館 2 階南側男女トイレ改修工事の下記の通り予定しております。

工事期間中はご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力の程何卒よろしくお願いいたします。

記

件 名 多摩キャンパス 2 号館 2 階南側男女トイレ改修工事

工事場所 多摩キャンパス 2 号館 2 階南側男女トイレ

工事日時 2023 年 7 月 30 日(日)～9 月 15 日(金)

工事会社 株式会社竹中工務店 担当者:松本氏

問合せ先 管財部調達課 大西・峯村・矢崎 (内線 2154)

備 考

- ・1 階メディアラボ事務室前廊下の一部が通行止めとなります。迂回にご協力をお願いいたします。
- ・2 号館 2 階西側に搬出入車両が停車いたします。
- ・騒音作業は、土日及び一斉休暇中に実施いたします。
- ・利用者の安全には十分留意しますので、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

以 上

■ 学内関係者様の安全確保、執務環境に十分配慮した仮設計画としています


全体仮設計画

● 作業所事務所・休憩所設置計画

- ・仮設ハウスを設置させていただき、トイレは2号館1階（施工箇所近く）のトイレを借用致します。
- ・使用する場所の床面にはシート養生を施し、竣工後はクリーニングを実施します。
- ・工事期間中は鍵の借用をさせていただきます。
- ・喫煙所は利用人数を調整の上、カルバート上駐車場内指定場所にて行うこととします。

● 搬出入車両動線計画




- ・正門坂からの搬出入車両動線がメイン動線となります。
- ・2号館1階東側と2階北側を搬出入口とし、資機材は台車等を使用し運搬します。
- ・正門坂からの搬出入を行うことで最短経路となり、より安全確保が可能となります。
- ・学内関係者との交差部分については安全確保を確実にし、制限速度(1.5km/h)を遵守し通行します。
- ・入庫時には誘導員を配置します。

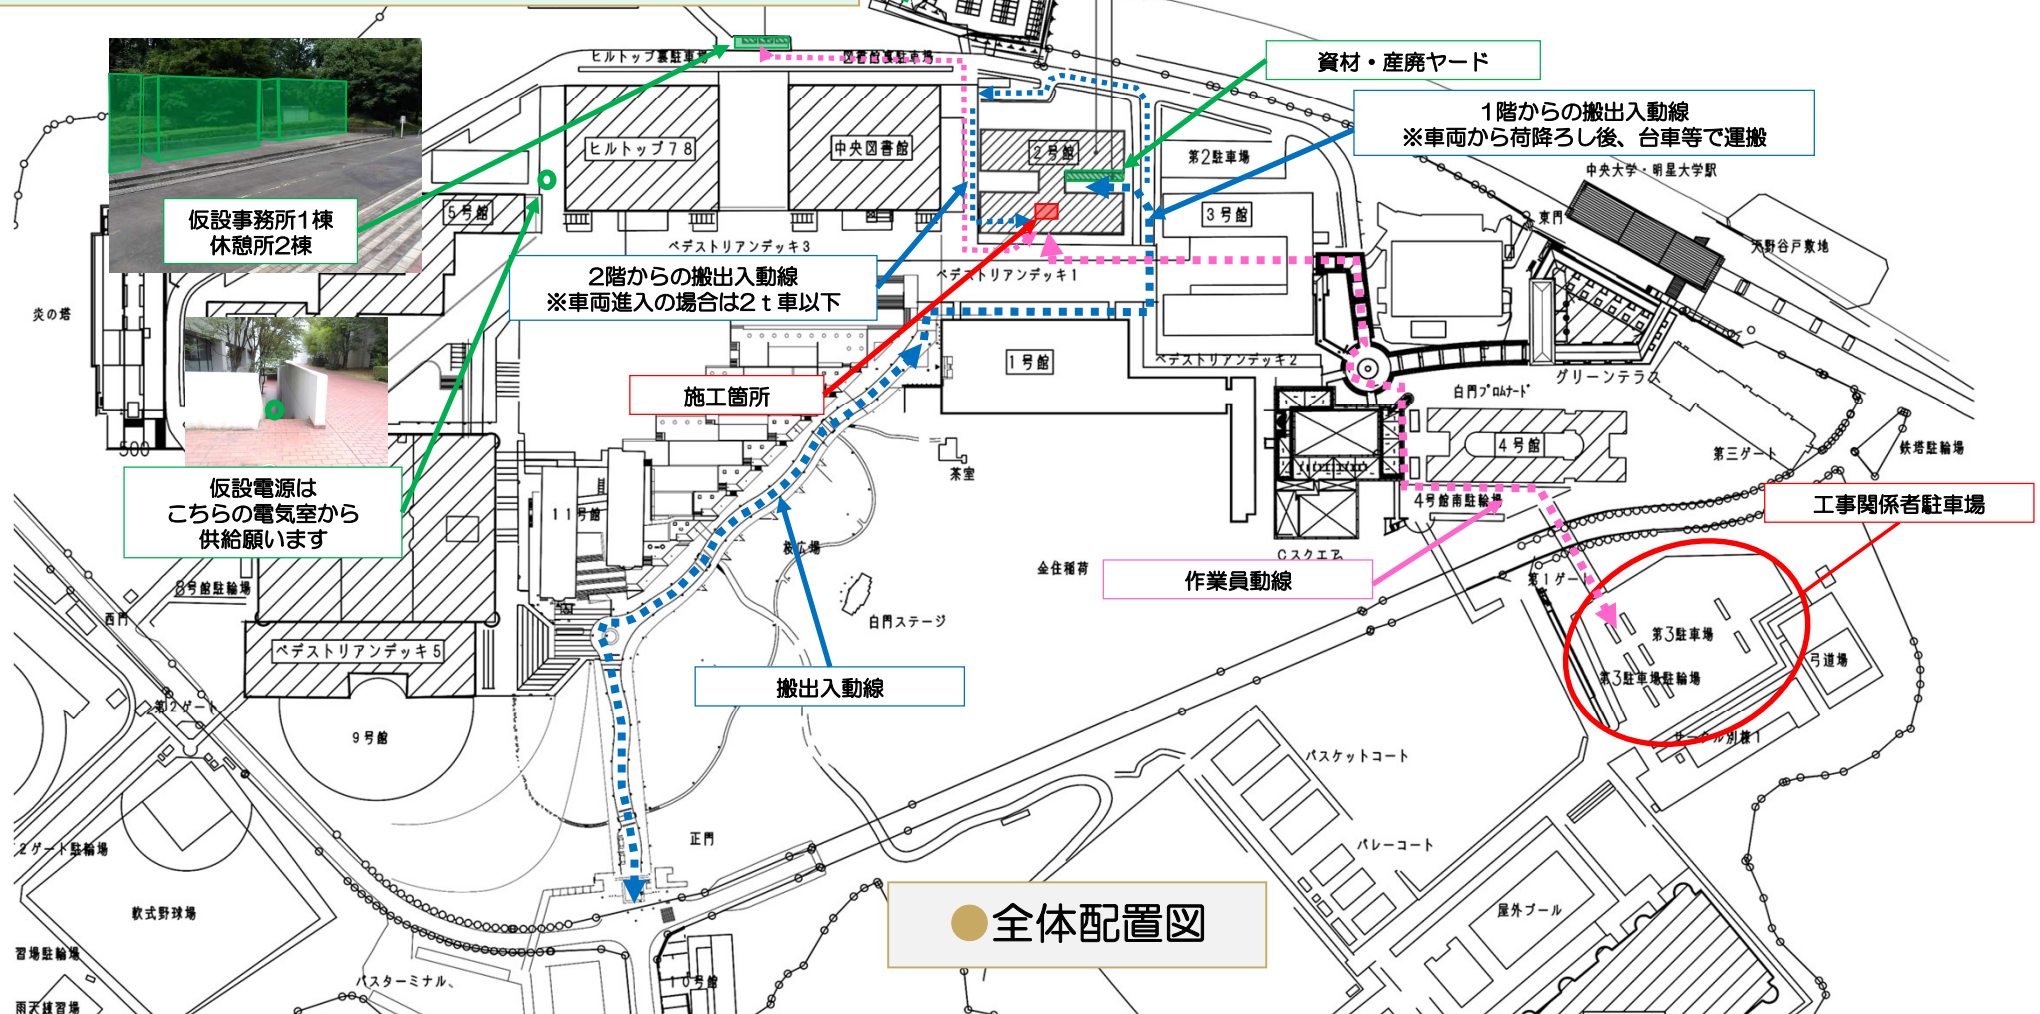

● 全体配置図

2号館1階仮設計画

- 天井解体復旧範囲
※作業時は施工範囲で**立入禁止区画**
(口2~3m程)。
第三者動線を常時確保いたします。

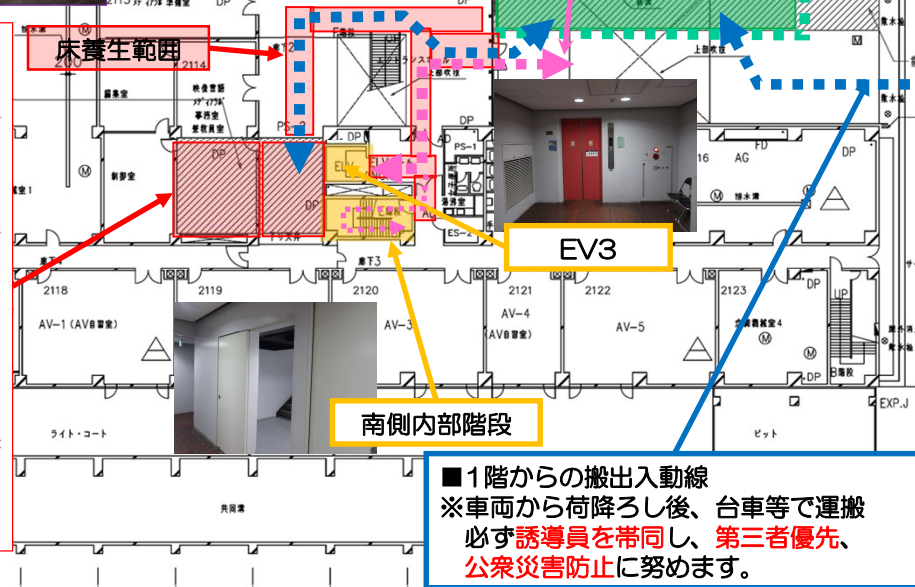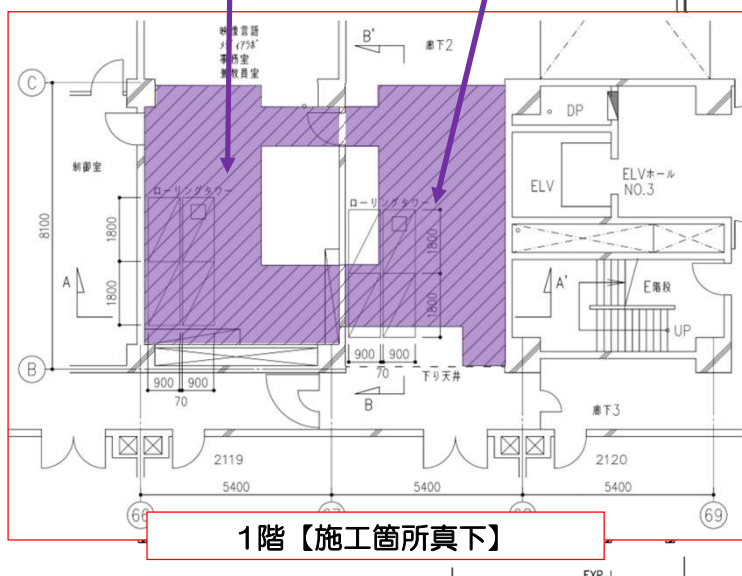

■作業員動線
※2階南側男女トイレへのアクセスとして
中央部内部階段を利用いたします。
部分的に動線床は養生、施工完了後は
クリーニングを施します。
第三者優先、公衆災害防止に努めます。



■資材・産廃ヤード
グリーンフェンスにて区画
20×3m程

搬出入車両 (4 t 車程)

■1階からの搬出入動線
※車両から荷降ろし後、台車等で運搬
必ず誘導員を帯同し、第三者優先、
公衆災害防止に努めます。

■ 正門から入場


学内関係者様優先の最適な工事計画

2号館2階仮設計画


●作業員・搬出入動線計画

(内装・既存設備解体時、資材搬出入時)

- 2号館2階パウダールームを資材ヤードとして一時利用いたします。
- 2号館2階前室1出入口を搬出入のメイン動線とします。
- 作業員他、人の施工箇所から事務所・休憩場へのアクセス動線は2号館2階前室1出入口を利用いたします。
- 資材・産廃運搬の際にEV3（籐内養生）を使用いたします。
- 搬出入及び、作業員動線利用をする際は、学内関係者優先で通行します。

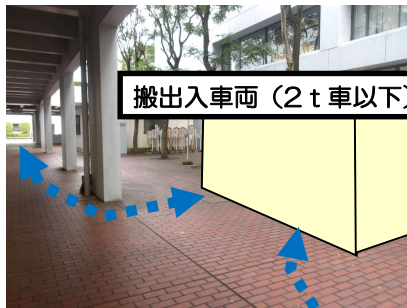

搬出入車両（2t車以下）

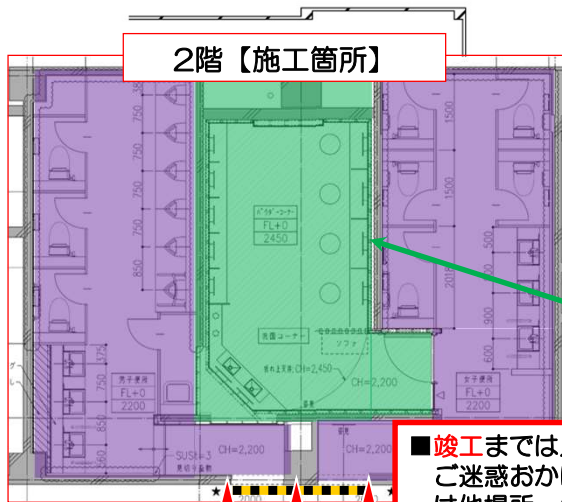

2階【施工箇所】

事務所・休憩所へ

■2階からの搬出入動線
※車両から荷降ろし後、台車等で運搬
必ず誘導員を帯同し、第三者優先、
公衆災害防止に努めます。
※ペDESTリアンデッキ上にかかる
車両は2t車以下とします。

●2号館2階平面図

EV3

南側内部階段

床養生範囲

■資材置場【一時利用】
※パウダールーム内を養生し
資材置場として利用させていただきます

■竣工までは入口から立入禁止区画いたします。
ご迷惑おかけいたしますが、トイレのご利用
は他場所、他階をお願いいたします。

■作業員動線
※休憩所から施工箇所へのアクセスとして
こちらの動線を活用いたします。
施工箇所からの出入の際は靴裏等、汚
れを除去し、施工完了後はクリーニングを
施します。
第三者優先、公衆災害防止に努めます。

正門から入場

■ 安全・工程に配慮した最適な工事計画

