

2026 年 7 月 21 日

関係者 各位

管財部 調達課

多摩キャンパス 3 号館中層棟電灯・コンセント分電盤更新工事について

平素より学内工事にご理解とご協力を賜りありがとうございます。

標記の件、電気設備の老朽化に伴う予防保全のため、多摩キャンパス 3 号館電灯・コンセント分電盤更新工事を下記の通り施工しております。

工事期間中はご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力の程何卒よろしくお願いいたします。

記

件 名 多摩キャンパス 3 号館中層棟電灯・コンセント分電盤更新工事

工事場所 多摩キャンパス 3 号館中層棟

工事期間 2026 年 8 月 10 日(月)～8 月 13 日(木)

工事会社 株式会社トーエネック(担当:平澤氏)

問合せ先 管財部調達課 諸星・矢崎 (内線 2155)

備 考

- ・作業日は、添付の工程表をご参照ください。
- ・停電時間は、原則 8 時～18 時までとなります。
- ・停電範囲は、添付資料をご参照ください。赤色・青色塗り部分となります。
- ・毎回、すべての対象箇所が停電となります。
- ・コンセントも停電となるため、OA 機器の取り扱いや冷蔵庫内の食品等にご注意ください。
- ・複合機・コピー機の電源オフをお願いいたします。
- ・3 号館裏駐車場の一部に産廃コンテナを設置します(8 月 10 日～8 月 13 日)。
- ・ご不便をお掛けいたしますが、ご理解とご協力の程をよろしくお願いいたします。

以 上

5. 工 程 表

作成日	2026年 5月 14日
確認	作成者

TOENEC

株式会社トーエネック


工事名	中央大学多摩キャンパス2026年度 3号館電灯・コンセント分電盤更新工事
-----	--------------------------------------

日	月・時間 場所・項目	8月											
		7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00
共通	地下1階・電気室			②ブレーカー開放 (送電禁止札取付)						②ブレーカー投入 (送電禁止札取外し)			
				1階～5階主幹開放(CorD系統の盤) ※3L-B-2更新時は3L-B-2幹線のみ 幹線リレーリンク						1階～5階主幹主幹投入(CorD系統の盤) ※3L-B-2更新時は3L-B-2幹線のみ 幹線リレーリンク			
10日(月)	5階 3L-5D			朝礼・KYミーティング									作業完了
	4階 3L-4D			分電盤2次側リレーリンク						分電盤2次側リレーリンク			
	3階 3L-3D			配線離線				配線接続			主幹1次電圧確認後主幹投入		
					既設盤(内機)取外し						分岐ブレーカー1次側電圧確認後投入		
11日(火)	2階 3L-2D			朝礼・KYミーティング									作業完了
	2階 3L-2D-1			分電盤2次側リレーリンク						分電盤2次側リレーリンク			
	1階 3L-1D			配線離線				配線接続			主幹1次電圧確認後主幹投入		
					既設盤(内機)取外し						分岐ブレーカー1次側電圧確認後投入		
12日(水)	5階 3L-5C			朝礼・KYミーティング									作業完了
	4階 3L-4C			分電盤2次側リレーリンク						分電盤2次側リレーリンク			
	3階 3L-3C			配線離線				配線接続			主幹1次電圧確認後主幹投入		
					既設盤(内機)取外し						分岐ブレーカー1次側電圧確認後投入		
13日(木)	2階 3L-2C			朝礼・KYミーティング									作業完了
	1階 3L-1C			分電盤2次側リレーリンク						分電盤2次側リレーリンク			
	B1階 3L-B-2			配線離線				配線接続			主幹1次電圧確認後主幹投入		
					既設盤(内機)取外し						分岐ブレーカー1次側電圧確認後投入		
特 記		・停電後、絶縁抵抗測定を実施し、作業前後での数値の変化が無い場合は良とします。但し、1【MΩ】を下回っている場合は、作業後に報告いたします。											

6-3. 各階平面図

①1階平面図

資料2-1

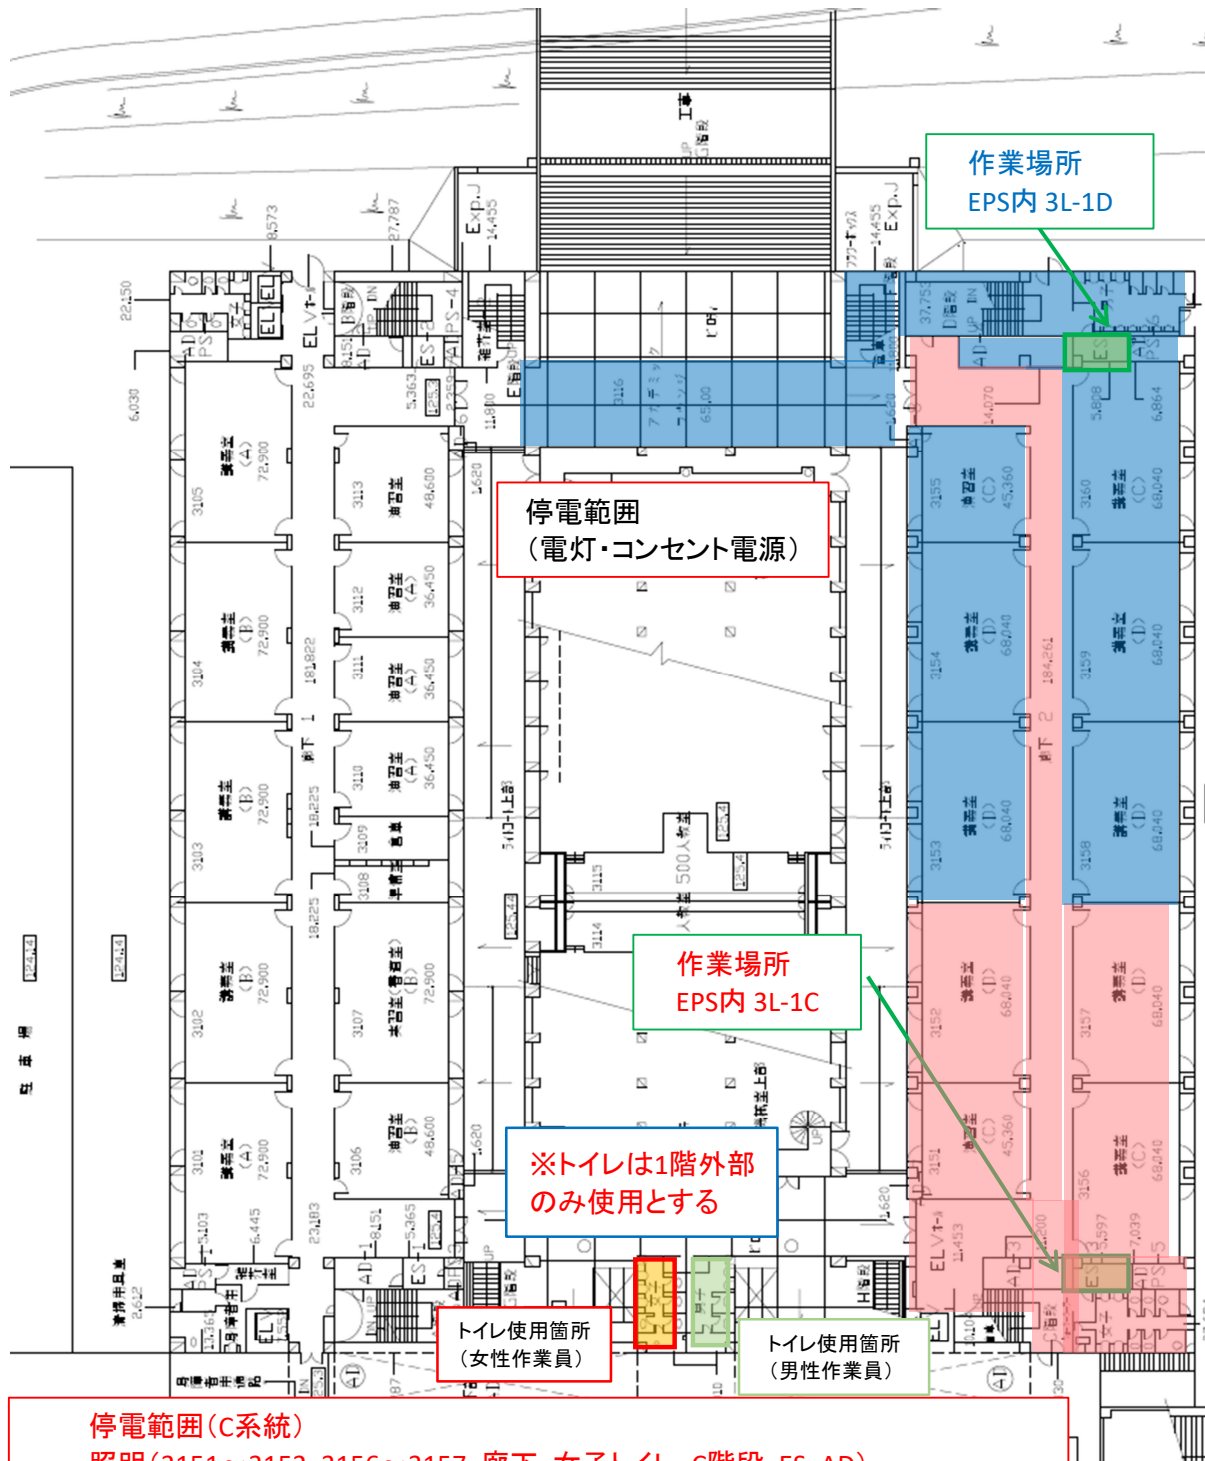

停電範囲(C系統)

照明 (3151~3152・3156~3157・廊下・女子トイレ・C階段・ES・AD)

コンセント (3151~3152・3156~3157・廊下・女子トイレ・ELVシャフト・ES・AD)

屋外コンセント盤・女子トイレ・冷水器・自動ドア・1F Catalyst3524

停電範囲(D系統)


照明 (3153~3155・3158~3160・男子トイレ・D・F階段)

コンセント (3153~3155・3158~3160・男子トイレ・ES)

誘導灯・男子トイレ・自動ドア・ラウンジ


②2階平面図

資料2-2

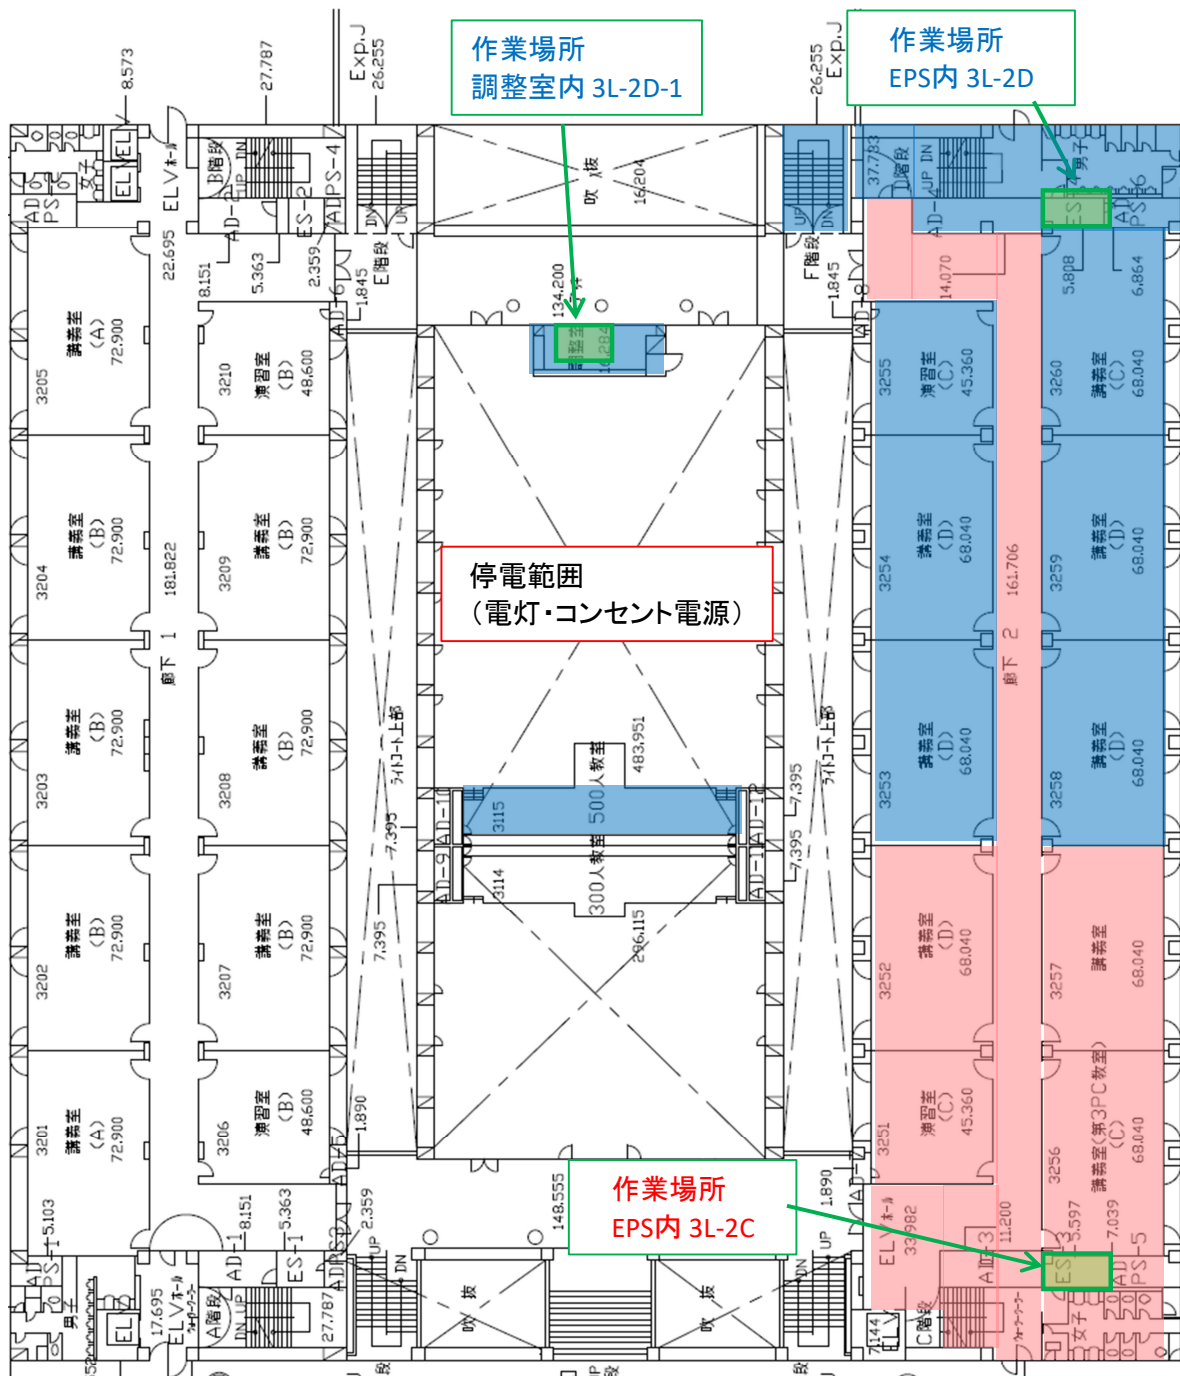

③3階平面図

資料2-3

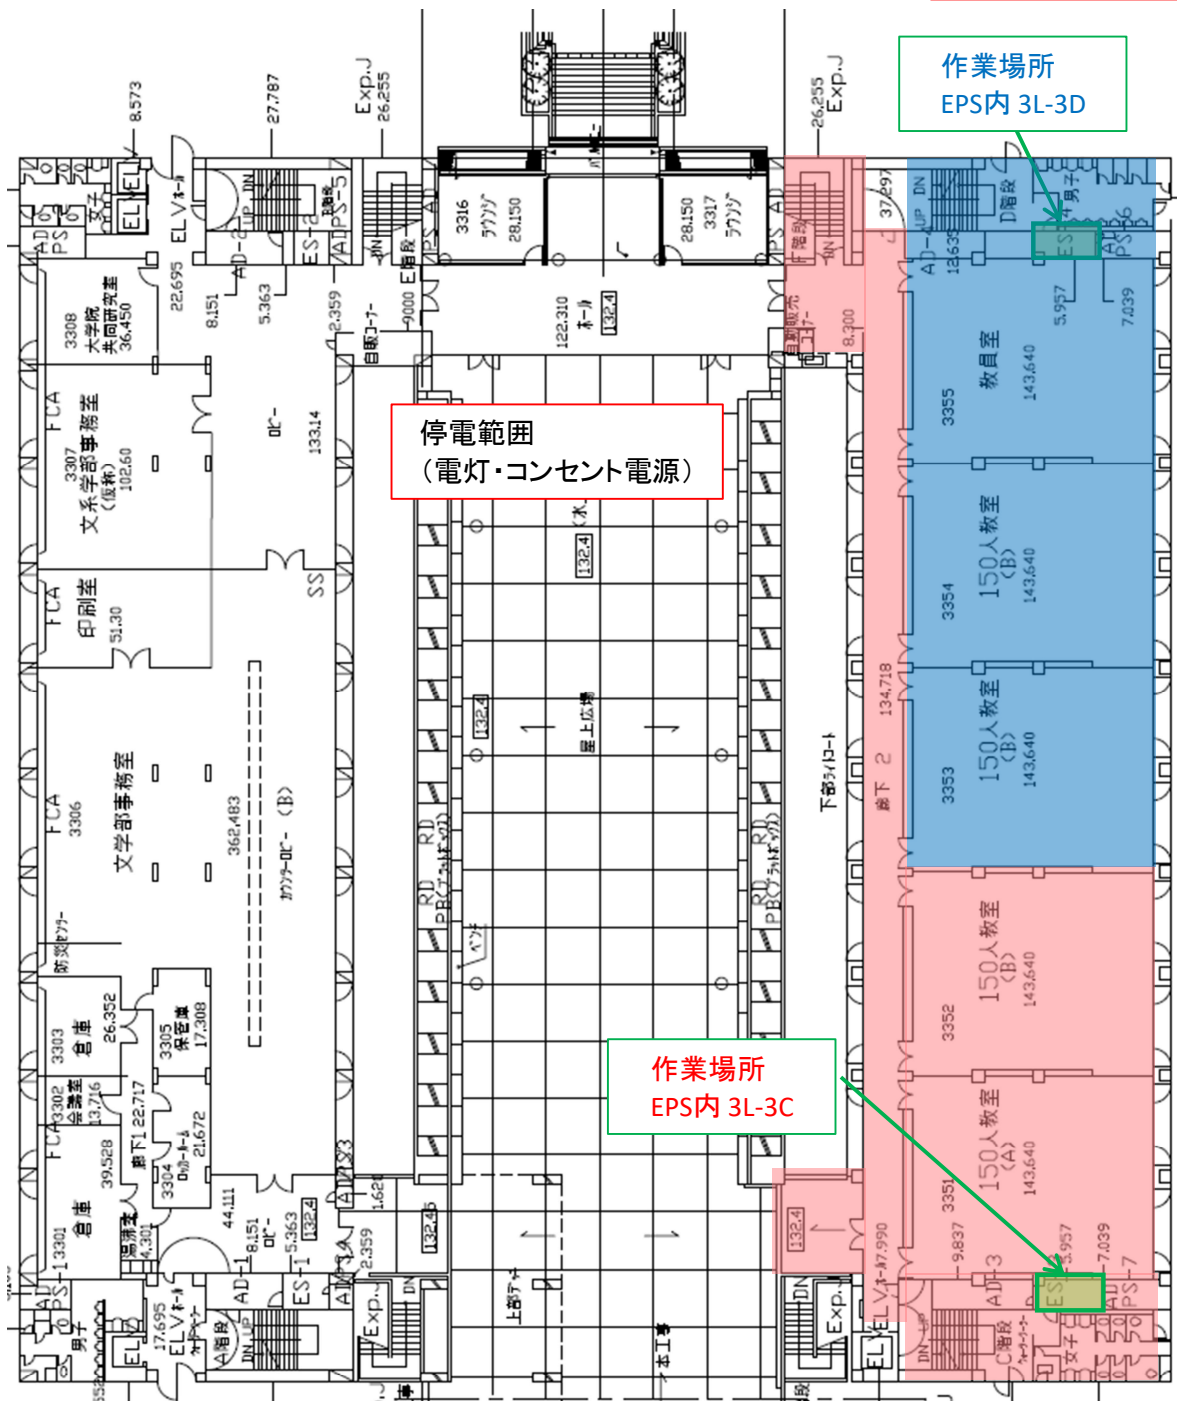

停電範囲(C系統)

照明(3351~3352・廊下・女子トイレ・C階段・ES・AD)

コンセント(3351~3352・廊下・女子トイレ・ES・AD)

女子トイレ・冷水器・自動ドア・60wアンプ(3351~3355)

停電範囲(D系統)

照明(3353~3355・男子トイレ・D・F階段)


コンセント(3353~3355・男子トイレ・ES・AD)

3L-3D-1・自動ドア・自動販売機

④4階平面図

停電範囲
(電灯・コンセント電源)

資料2-4

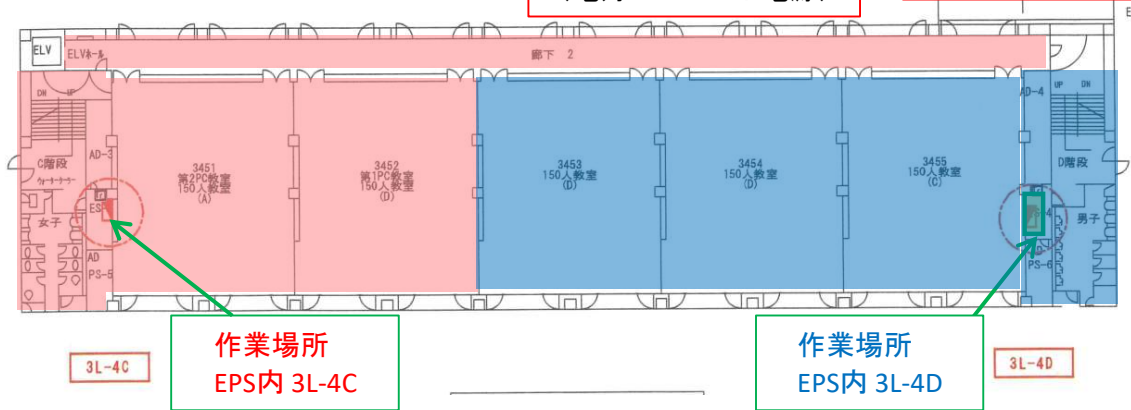

停電範囲(C系統)

照明(3451~3452・廊下・C階段)

コンセント(3451~3452・廊下・女子トイレ)

60wアンプ(3451~3455)・4F Catalyst3524・冷水器・警報盤


停電範囲(D系統)

照明(3453~3455・男子トイレ・D階段)

コンセント(3453~3455・男子トイレ・ES・AD)

⑤5階平面図

停電範囲
(電灯・コンセント電源)

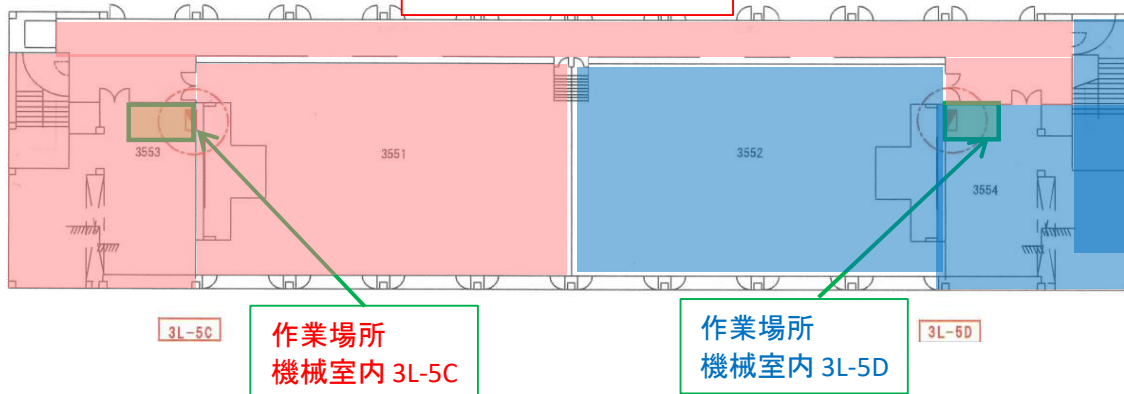

停電範囲(C系統)

照明(3551・3553・3641・廊下・C階段)

コンセント(3551・3553・3641・廊下)


3551(黑板灯、黑板操作盤、120Vアンプ、映写機、スライド)・冷水器・警報盤

停電範囲(D系統)

照明(3552・3554・D階段)

コンセント(3552・3554・ES・AD)

3552(黑板灯、黑板操作盤、120Vアンプ、映写機、スライド、レクチャーテーブル)

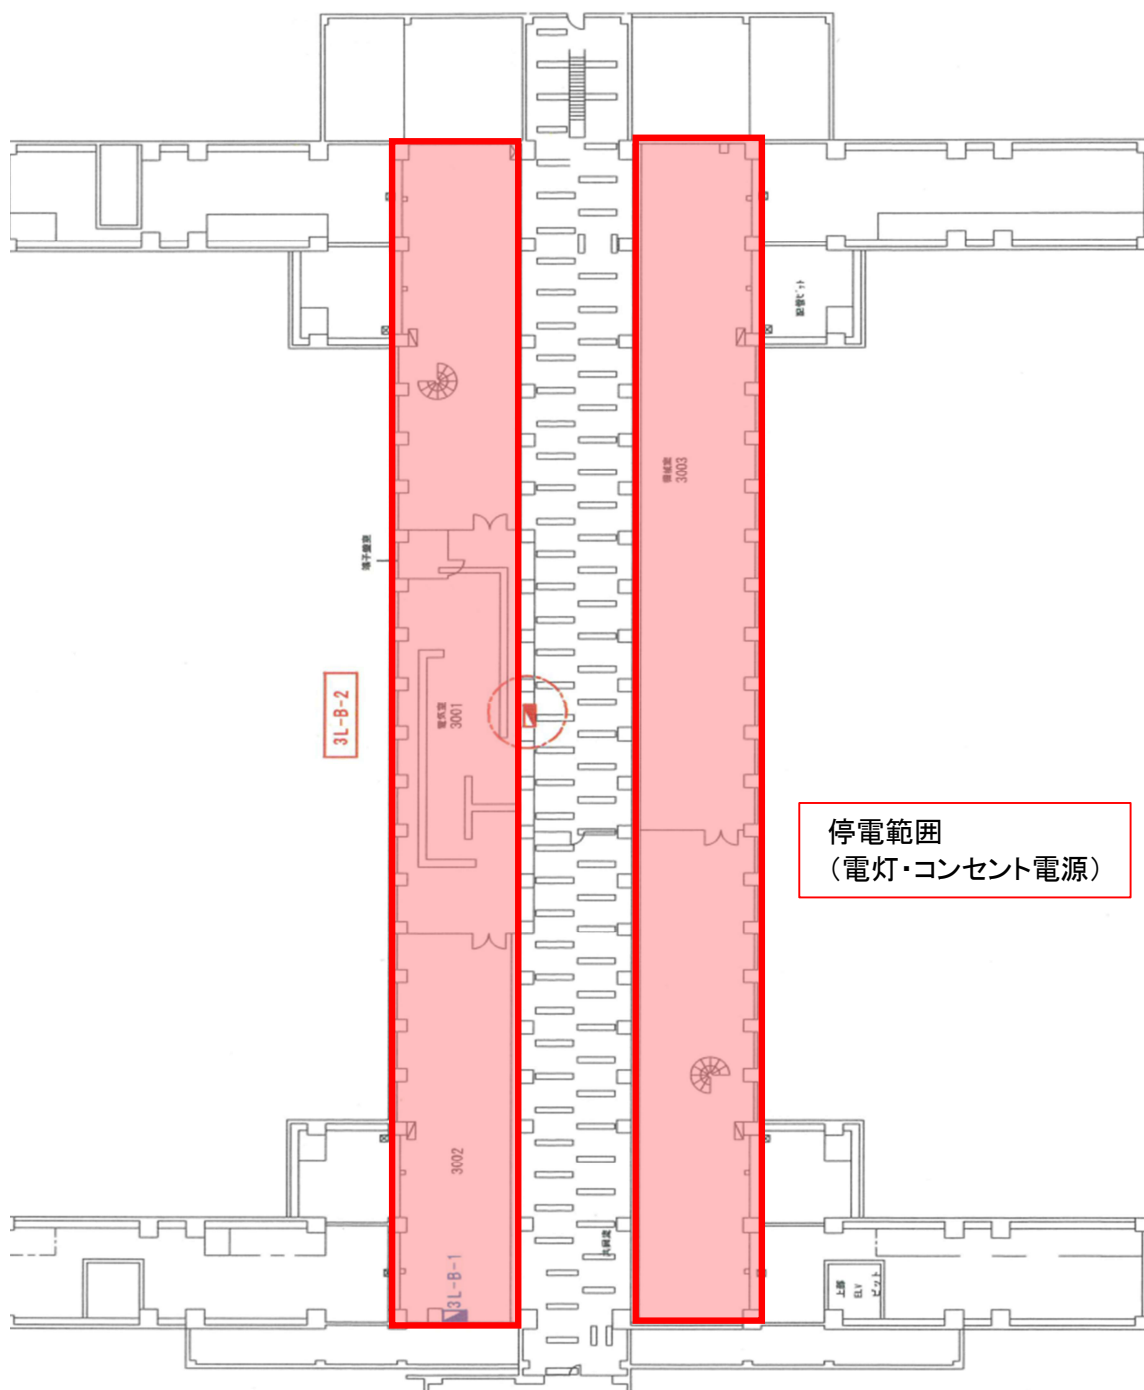


停電範囲

照明(3001電気室～3003Bコア・Dコア～3002Cコア・Aコア)

コンセント(3001電気室～共同溝ラック付コンセント～3002・3003～テレビ
共聴増幅用コンセント)

6-4.3号館横駐車場利用箇所

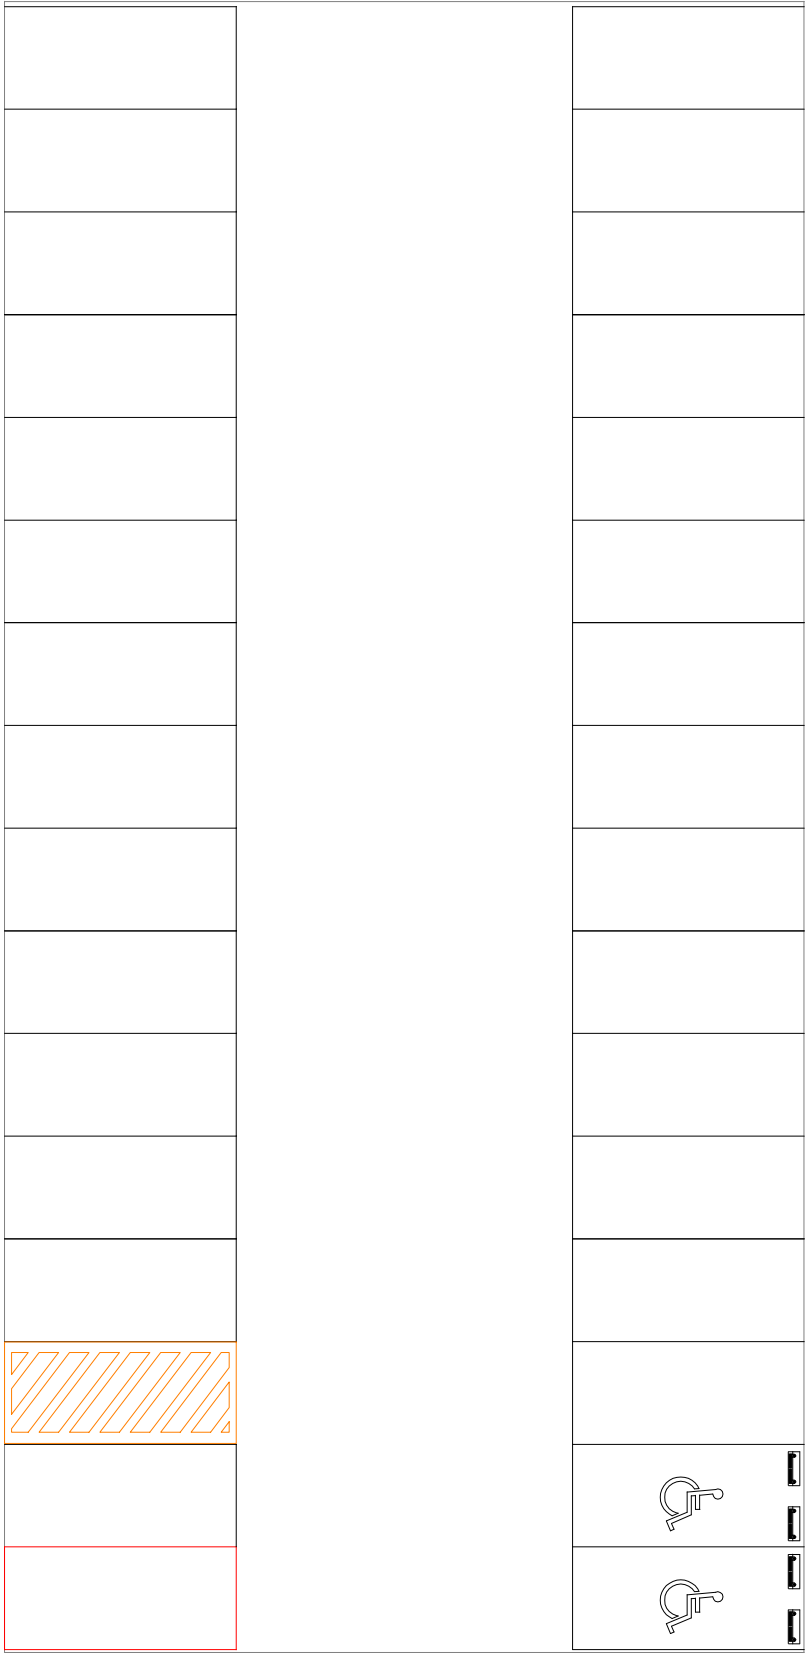

3号棟

工事期間中、トラック（1.5t）を置かせていただきたい
（撤去した盤の保管場所として）
期間：2026年8月10日（月）～2026年8月13日（木）
